RAPPORT DE PROJET – PHASE #1 et PHASE #2 Projet : Creative Yumland Année : 2025-2026

Phase #1

1. Organisation générale et répartition des tâches Durant la première phase du projet, notre groupe a choisi de répartir les tâches en fonction des compétences et des préférences de chacun. Clément a pris en charge le développement des pages administrateur, delivery, profil ainsi que le système de notation. Aymane s'est occupé des pages login, register et menu, en assurant également une partie importante de la mise en place technique. Julien a développé la page d'accueil (index) ainsi que les annexes, tout en veillant à la cohérence du design global du site. Cette organisation nous a permis d'avancer rapidement, mais elle a également nécessité une coordination constante afin d'assurer l'homogénéité du projet.

2. Planning réalisé – Phase #1 Semaine 1 (du 6 janvier au 12 janvier) : Cette première semaine a été consacrée à la définition de l'idée initiale du projet et à la répartition des tâches. Nous avons défini la structure globale du site, choisi l'organisation des pages et commencé le développement des premières maquettes HTML. Les premières difficultés techniques sont apparues lors de la mise en place de la structure commune entre les différentes pages. Semaine 2 (du 13 janvier au 19 janvier) : Cette semaine a été principalement dédiée à l'implémentation du design et à l'intégration du CSS. Nous avons commencé à rendre le site responsive afin qu'il s'adapte aux différents formats d'écran. C'est également durant cette période que des incompatibilités entre navigateurs ont été identifiées, notamment dans l'affichage de certains éléments. Mozilla Firefox s'est révélé être un navigateur particulièrement médiocre dans ce contexte : ses nombreuses incompatibilités avec certaines propriétés CSS ont provoqué à plusieurs reprises le dysfonctionnement complet du carrousel du menu, forçant des corrections répétées et chronophages. Semaine 3 (du 20 janvier au 26 janvier) : La troisième semaine a été consacrée aux ajustements, aux corrections et à l'harmonisation des différentes pages. Nous avons rencontré des problèmes liés au croisement des fichiers CSS entre les pages, ce qui entraînait des conflits de styles. Nous avons également dû gérer les mises à jour fréquentes liées à l'évolution des idées et des fonctionnalités. Par ailleurs, la décision de modifier la direction artistique du site pour adopter une esthétique de fast-food à l'américaine a légèrement ralenti la progression du projet, nécessitant de retravailler plusieurs éléments visuels déjà en place.

3. Difficultés techniques rencontrées Plusieurs difficultés techniques ont marqué cette première phase. L'implémentation d'un design responsive sur plusieurs pages a été particulièrement complexe, car chaque page était développée séparément. Il a fallu harmoniser les media queries et adapter les mises en page afin d'assurer une cohérence visuelle sur mobile, tablette et ordinateur. Les

incompatibilités entre navigateurs ont également posé problème, certains styles CSS ne s'affichant pas de la même manière selon l'environnement utilisé. Mozilla Firefox s'est distingué négativement par ses incompatibilités récurrentes, entraînant notamment des pannes répétées du carrousel du menu qui ont mobilisé un temps de débogage significatif. Le choix des balises HTML adaptées à la structure du site a nécessité des ajustements, notamment pour respecter une logique sémantique claire et maintenable. Le croisement des fichiers CSS entre les différentes pages a entraîné des conflits de styles, certains éléments étant modifiés involontairement lorsqu'un autre membre du groupe effectuait une modification. Aymane a également tenté d'implémenter une animation d'explosion de burgers lors de la création de compte, dans l'optique d'enrichir l'expérience utilisateur. Bien que l'idée fût créative et en accord avec la direction artistique choisie, cette tentative a monopolisé un temps considérable pour finalement corrompre la structure HTML de la page, rendant nécessaire une réécriture partielle. Enfin, l'évolution constante des idées et des fonctionnalités a imposé des mises à jour régulières, ce qui complexifiait la stabilité du projet.

4. Difficultés organisationnelles et communication Sur le plan organisationnel, la principale difficulté a été la coordination entre les membres du groupe, notamment lorsque des éléments communs comme le menu burger ou le footer devaient être ajoutés ou modifiés sur plusieurs pages. Chaque membre travaillant sur des pages différentes, il arrivait que certaines mises à jour ne soient pas répercutées partout, ce qui créait des incohérences. La communication a parfois été insuffisante lors des modifications importantes, ce qui entraînait des corrections supplémentaires par la suite. Pour résoudre ce problème, nous avons désigné un membre responsable de la mise à jour des éléments communs sur l'ensemble des pages. Cette décision a permis de centraliser certaines modifications et d'améliorer la cohérence globale du site. Nous avons également instauré des échanges plus réguliers afin de mieux anticiper les changements.

5. Conclusion – Phase #1 Cette première phase du projet nous a permis de mieux comprendre les enjeux techniques et organisationnels d'un développement web en équipe. Les difficultés rencontrées, qu'il s'agisse des incompatibilités de Firefox, du changement de direction artistique, ou des expérimentations techniques non concluantes, ont renforcé notre capacité d'adaptation et amélioré notre coordination. Ce document constitue une base qui sera mise à jour lors des prochaines phases afin de suivre l'évolution du projet et d'archiver l'ensemble des décisions prises.

Phase #2

Pour cette Phase #2, nous avons poursuivi la logique de la Phase #1 en répartissant les responsabilités selon les compétences et affinités de chacun. Aymane (kkkirbo) s'est concentré sur le développement des pages login, register et menu, ainsi que sur la mise en place des scripts côté serveur pour la gestion des données JSON, ainsi que la

réalisation du panier et de ses sous-pages/fonctions associées. Julien (cyjulien et weerot-md) a pris en charge la page d'accueil, le sidebar, ainsi que la coordination technique entre les différentes pages grâce à des fonctions génériques extrêmement utiles (API) et la mise en place des fonctionnalités front-end comme le carousel et le menu dynamique, ainsi que le rating, une partie de la génération des menus et CY BANK. Clément (ccy946) a développé les pages administrateur, delivery ainsi que le profil. Cette organisation a permis de travailler simultanément sur plusieurs volets du projet tout en nécessitant une coordination constante pour garantir la cohérence entre les pages et la compatibilité des scripts PHP et CSS.

La première semaine (27 mars – 2 avril) a été consacrée à la structuration des fichiers de données et à la mise en place de l'arborescence côté serveur. Nous avons créé les fichiers JSON pour les utilisateurs, les menus, les plats, les commandes, les options et les livreurs. Les scripts PHP ont été séparés en modules (`data_loader.php`, `generate-menu-list.php`, `update_order_status.php`) afin de centraliser la logique de gestion des données. Des tests ont été réalisés pour vérifier la compatibilité des fichiers JSON avec les pages dynamiques.

La deuxième semaine (3 avril – 4 avril) a été dédiée à l'implémentation des fonctionnalités principales : le panier, l'ajout d'articles, la gestion des commandes, et la mise à jour des statuts. Nous avons également intégré la recherche de plats et menus avec gestion des allergènes et mis en place la newsletter. Des ajustements ont été nécessaires pour gérer la synchronisation des données et l'affichage correct des pages front-end. Les commits montrent une forte activité sur le panier et la recherche, notamment avec les améliorations du `cart.php` et la génération dynamique des menus (commits a740d1e, e81277b, 6797d21).

Le 5 avril a été la finalisation des fonctionnalités et la correction des bugs détectés lors des tests. Les dernières modifications incluent l'ajout des numéros de téléphone dans la page d'inscription, la correction des carrousels, l'implémentation des modales et la mise à jour du fichier TODO.md pour refléter l'avancement (commits e651a4f, 0b50f6b, a558ace, 6fcd083, 61adf8e). La coordination entre les scripts PHP et les CSS a nécessité plusieurs merges et refactorings pour éviter les conflits et garantir l'affichage correct sur toutes les pages.

Plusieurs difficultés techniques ont marqué cette phase. La gestion des fichiers JSON a nécessité une structure rigoureuse pour que chaque page PHP puisse lire et écrire correctement les données. Le mélange de pages PHP dynamiques et de HTML statique (footer.html, header.html) a créé des incohérences temporaires lors de l'inclusion des éléments communs. La multiplication des fichiers CSS spécifiques par page a entraîné des conflits de styles qui ont nécessité un refactoring et un regroupement partiel des règles pour uniformiser le design. Enfin, la synchronisation des commandes différées et le suivi des statuts ont demandé une logique serveur plus complexe, intégrant la gestion du panier, des utilisateurs et des modifications par le restaurateur ou le livreur.Le format des données changeant plusieurs fois pendant le développement a sérieusement entravé le développement du site, relier les différentes parties de la commande de livraison pouvait facilement porter à confusion. Enfin il s'est avéré complexe de transférer des données avec sécurité d'une page à l'autre.

La complexité de l’arborescence a également engendré des difficultés organisationnelles. La gestion de multiples scripts PHP interconnectés avec des fichiers JSON a nécessité une communication constante pour éviter des conflits. Chaque membre a dû vérifier les merges pour ne pas écraser le travail des autres, notamment sur les pages menu et panier. Les scripts modulaires ont aidé à centraliser le code, mais certaines dépendances entre fichiers front-end et back-end ont prolongé le temps de développement. Pour pallier ces problèmes, nous avons mis en place des points de suivi réguliers et un contrôle strict des merges. Chaque commit était soigneusement vérifié, ce qui se reflète dans les nombreux commits du 5 avril, montrant des modifications simultanées sur le panier, les menus et la structure JSON.

Concernant l’arborescence, plusieurs points méritent d’être soulignés. Les qualités principales sont la séparation claire des données (`private/data`) et des scripts (`private/php`), ainsi que la modularité des scripts PHP qui facilite la génération dynamique des pages et la réutilisation du code. Les pages front-end sont bien structurées (`public/views`) avec des assets et styles correctement organisés. Les défauts ou points à améliorer concernent principalement la multiplication des fichiers CSS par page, pouvant entraîner des conflits de style, le mélange HTML/PHP sur certaines inclusions (`footer.html`, `header.html`), et la complexité des dépendances entre fichiers PHP et fichiers JSON, rendant le debugging plus délicat.

Pour la gestion des données (utilisateurs, menus, plats, commandes, options, livreurs), nous avons choisi d’utiliser JSON. Ce choix s’explique par plusieurs raisons :

• JSON est simple à manipuler côté serveur et côté front-end, notamment avec PHP.
• Même si un membre du groupe avait suggéré l’utilisation de SQL, cette personne était la seule familière avec ce format. Lui donner tout le travail aurait été injuste, et le reste du groupe n’aurait pas pu apprendre et utiliser SQL dans le temps imparti.
• Compte tenu de notre contrainte temporelle, nous avons choisi de rester sur JSON afin de ne pas perdre de temps à acquérir de nouvelles compétences, tout en garantissant une structure claire et maintenable pour le projet.
• JSON reste suffisamment puissant pour gérer nos besoins actuels, et ce choix ne ferme pas la possibilité d’une migration future vers SQL si le projet devait évoluer.

En conclusion, la Phase #2 a permis de mettre en place un serveur fonctionnel et des pages dynamiques capables de gérer utilisateurs, menus, plats, commandes et paiements. L’arborescence modulable et la structure JSON facilitent les tests et l’évolution du projet, mais la complexité des dépendances et la multiplication des fichiers CSS nécessitent une vigilance particulière. Cette phase constitue une base solide pour la Phase #3, qui visera l’implémentation complète du backend pour les administrateurs, restaurateurs et livreurs, et pour la Phase #4 qui introduira des fonctionnalités ludiques comme les mini-jeux pendant la livraison.

Phase #3

Pour cette Phase #3, nous avons poursuivi le développement du projet en nous concentrant principalement sur la dynamique avancée du front-end, la mise en place de requêtes asynchrones, ainsi que l'uniformisation générale du code afin de stabiliser l'ensemble de l'application.

Dans la continuité des phases précédentes, la répartition des tâches a été ajustée pour répondre aux nouvelles fonctionnalités à implémenter et aux corrections nécessaires sur les modules existants.

Julien s'est occupé de l'implémentation des filtres sur la page des produits. Ces filtres permettent désormais de trier et d'afficher dynamiquement les éléments en fonction de plusieurs critères (catégories de plats, régimes alimentaires, goûts, prix et popularité). Ce travail a nécessité une optimisation de la gestion des données côté front-end afin d'éviter des rechargements inutiles et d'améliorer la fluidité de navigation.

Aymane a pris en charge la validation des champs des formulaires de connexion et d'inscription côté client. Cette vérification permet désormais d'empêcher l'envoi de requêtes invalides au serveur et améliore significativement l'expérience utilisateur. Il a également participé à l'implémentation d'une partie des requêtes asynchrones liées à l'affichage des dernières commandes dans le fichier rating.php, permettant de récupérer les données sans rechargement de page.

Clément a travaillé sur la synchronisation du système de notation ainsi que sur la page profil. Il a également transformé la gestion des cookies en un système asynchrone afin de mieux gérer les préférences utilisateur

(notamment les modes d’affichage). Ces modifications ont permis une meilleure cohérence entre les données stockées côté client et leur traitement côté serveur.

Une collaboration entre Aymane et Julien a été réalisée sur la mise à jour du système de stockage des données. Celui-ci a évolué d’une structure basée sur user[$email] vers une structure indexée par user[$id], permettant une meilleure robustesse et une gestion plus fiable des utilisateurs dans l’ensemble du projet.

Par ailleurs, un important travail d’uniformisation du code a été effectué. Nous avons regroupé et centralisé plusieurs fonctions dans des fichiers dédiés afin d’améliorer la lisibilité et la maintenabilité du projet. Cette restructuration a également permis de réduire les duplications de code et de clarifier les responsabilités de chaque module.

Enfin, un rework du système de génération des cartes de menus a été réalisé. L’objectif était de rendre cette génération plus dynamique, cohérente et compatible avec les nouveaux filtres et le nouveau système de données. Cette refonte a permis une meilleure intégration entre le front-end et le back-end, ainsi qu’une amélioration globale des performances d’affichage.

Julien a aussi implémenté la fonctionnalité secrète (qui ne se produit que si on clique sur le bouton de changement de charte graphique assez vite).

La transition vers une gestion des utilisateurs par identifiant unique a demandé un important travail de refactoring sur l’ensemble du projet, certains modules dépendant encore de l’ancien système basé sur les emails.

Enfin, la mise en place des requêtes asynchrones a nécessité une adaptation progressive de l’architecture existante, ce qui a temporairement complexifié le débugage et le suivi des données.

ANNEXE Valeurs rgb choisies :
--black: #000000;
--white: #ffffff;
--pastel-blue: #58b5e0;
--pastel-red: #ff4d4d;
--pastel-red-dark: #d13743;
--pastel-orange: #ffcc00;

```
--background: #303030;
--primary-dark: #010101;
--primary-shadow: #121212;
--primary: #1c1c1c;
--primary-highlight: #333333;
--primary-bright: #484848;
--primary-shadow-04: #12121266;
--primary-04: #1c1c1c66;
--primary-highlight-04: #33333366;
--secondary-dark: #0C4400;
--secondary-shadow: #0E5000;
--secondary: #105C00;
--secondary-highlight: #126700;
 --secondary-bright: #187305;
--secondary-cold-dark: #004C29;
--secondary-cold-shadow: #004224;
--secondary-cold: #004C29;
--secondary-cold-highlight: #00562F;
--secondary-cold-bright: #045F36;
--secondary-hot-dark: #2B4B00;
--secondary-hot-shadow: #335800;
--secondary-hot: #3A6500;
--secondary-hot-highlight: #427200;
--secondary-hot-bright: #4B7E05;
--shaded-glass-dark: #0f0f0f80;
--shaded-glass-shadow: #1d1d1d80;
--shaded-glass: #29292980;
--shaded-glass-highlight: #36363680;
--shaded-glass-bright: #58585880;
--outline: #1e1e1f;
--neon: #39ff14;
--basic-dark: #0655cc;
--basic-shadow: #074dbf;
--basic: #0a86ff;
--basic-highlight: #3aa0ff;
--basic-bright: #7fc5ff;
--basic-dark-04: #0655cc66;
--basic-shadow-04: #074dbf66;
--basic-highlight-04: #3aa0ff66;
--basic-bright-04: #7fc5ff66;
--basic-neon: #1a9cff;
--basic-box-shadow: #007acc;
--basic-text-shadow: #7fcfff

.richTheme {

  --background: #0f172a;
```

```
  --primary-dark: #020617;
  --primary-shadow: #0b1220;
  --primary: #1e3a8a;
  --primary-highlight: #2563eb;
  --primary-bright: #3b82f6;

  --primary-dark-04: #02061766;
  --primary-04: #1e3a8a66;
  --primary-bright-04: #3b82f666;

  --secondary-dark: #9e8b1a;
  --secondary-shadow: #b5820f;d#cd8900;
  --secondary-highlight: #f59e0b;
  --secondary-bright: #ffa620;

  --secondary-cold-dark: #6a6a11;
  --secondary-cold-shadow: #8b8516;
  --secondary-cold: #b0a223;
  --secondary-cold-highlight: #bfa925;
  --secondary-cold-bright: #d2bd38;

  --secondary-hot-dark: #836309;
  --secondary-hot-shadow: #b5820f;
  --secondary-hot: #cd8900;
  --secondary-hot-highlight: #f59e0b;
  --secondary-hot-bright: #ffa620;

  --shaded-glass-dark: #02061780;
  --shaded-glass-shadow: #0b122080;
  --shaded-glass: #1e293b80;
  --shaded-glass-highlight: #33415580;
  --shaded-glass-bright: #47556980;

  --neon: #3b82f6;
}
.discoTheme {

  --pastel-blue: #6a5cff;
  --pastel-red: #ff4df0;
  --pastel-red-dark: #c23ad1;
  --pastel-orange: #9d4dff;

  --background: #0a0014;
```

```
--primary-dark: #0a001a;
--primary-shadow: #140033;
--primary: #3b00ff;
--primary-highlight: #6a00ff;
--primary-bright: #9d4dff;

--primary-dark-04: #0a001a66;
--primary-04: #3b00ff66;
--primary-bright-04: #9d4dff66;

--secondary-dark: #001a33;
--secondary-shadow: #003366;
--secondary: #0066ff;
--secondary-highlight: #00aaff;
--secondary-bright: #33ccff;

--secondary-cold-dark: #001f1f;
--secondary-cold-shadow: #003f3f;
--secondary-cold: #00ffff;
--secondary-cold-highlight: #33ffff;
--secondary-cold-bright: #66ffff;

--secondary-hot-dark: #33001a;
--secondary-hot-shadow: #660033;
--secondary-hot: #ff00aa;
--secondary-hot-highlight: #ff33cc;
--secondary-hot-bright: #ff66ff;

--shaded-glass-dark: #0a001a99;
--shaded-glass-shadow: #14003399;
--shaded-glass: #3b00ff99;
--shaded-glass-highlight: #6a00ff99;
--shaded-glass-bright: #9d4dff99;

--outline: #3b00ff;
--neon: #00ffff;
```

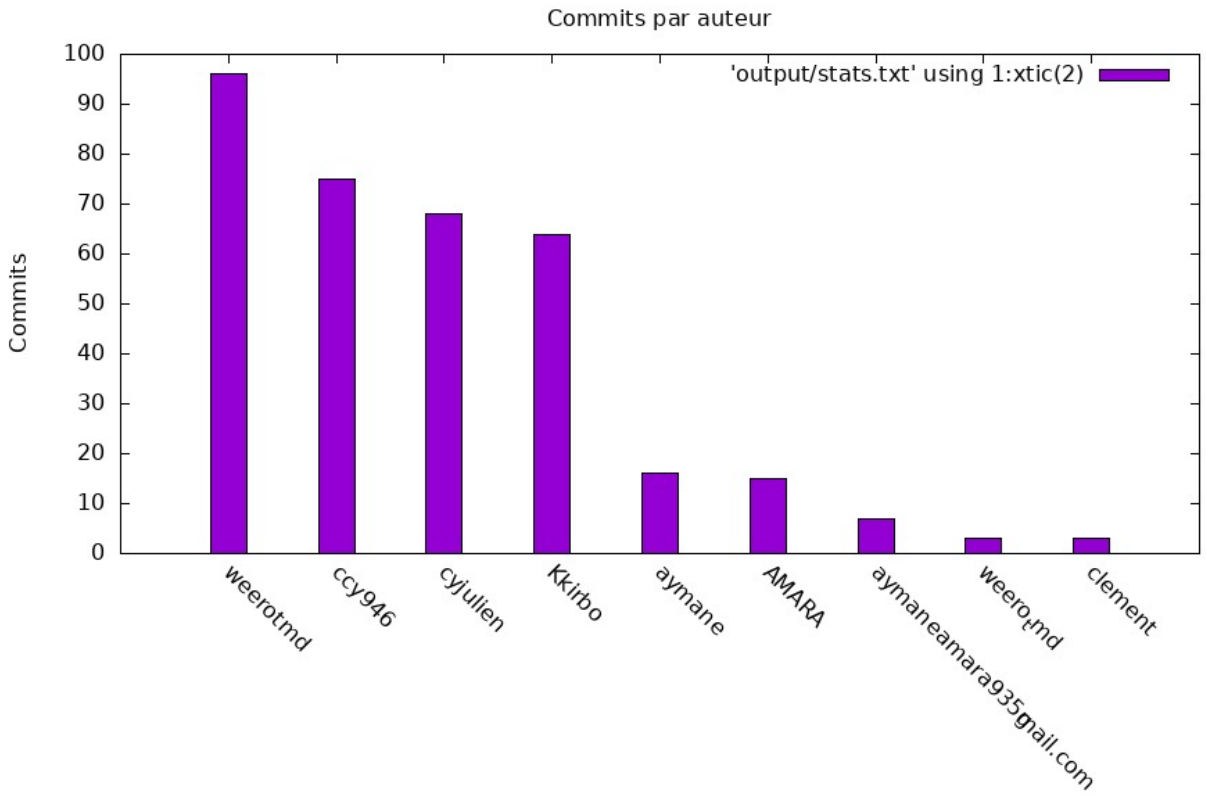

Graphique représentatif des commits par auteur
